

INFORMATIONSBREV vecka 07 2025

Renovering Ärentunaskolan

Hej hej!

I dagsläget pågår arbeten på flera fronter, både i Hus C och Hus A1

I Hus C pågår installationsarbeten för fullt och målningsarbetet blir färdigställt inom kort. Även takarbeten har påbörjats.

I Hus A1 har rivningsarbeten startats och på vinden monteras ventilationsrör. Vi börjar också bygga ett ställningstorn för intransport av material på utsidan och under nästa vecka fortsätter vi på insidan av stora entrén.

Under nästa vecka startar även markarbeten i den första etappen runt Hus D, se arbetsområdet på första bilden nedan.

I dagsläget jobbar cirka 10 personer i Hus A1 och 14 personer i Hus C.

Nedan redovisas vad som kommer pågå de närmaste veckorna:

Vecka 08

- El- och ventilationskompletteringar i Hus C
- Rivning i Hus A1
- Start markarbeten

Vecka 09

- Kompletteringar undertak i Hus C
- Start mattläggning i Hus C
- Plåtarbeten Hus C

Vecka 10

- Start gipsväggar i Hus A1
- Mattläggning i Hus C
- El- och ventilationskompletteringar i Hus C


Vecka 11

- Start montage akustikabsorbenter i Hus C
- Start isolering kanaler på vind i Hus A1
- Start kabeldragning i Hus A1



Önskar er en fin alla hjärtans dag!

Med vänlig hälsning
Projekt Ärentunaskolan

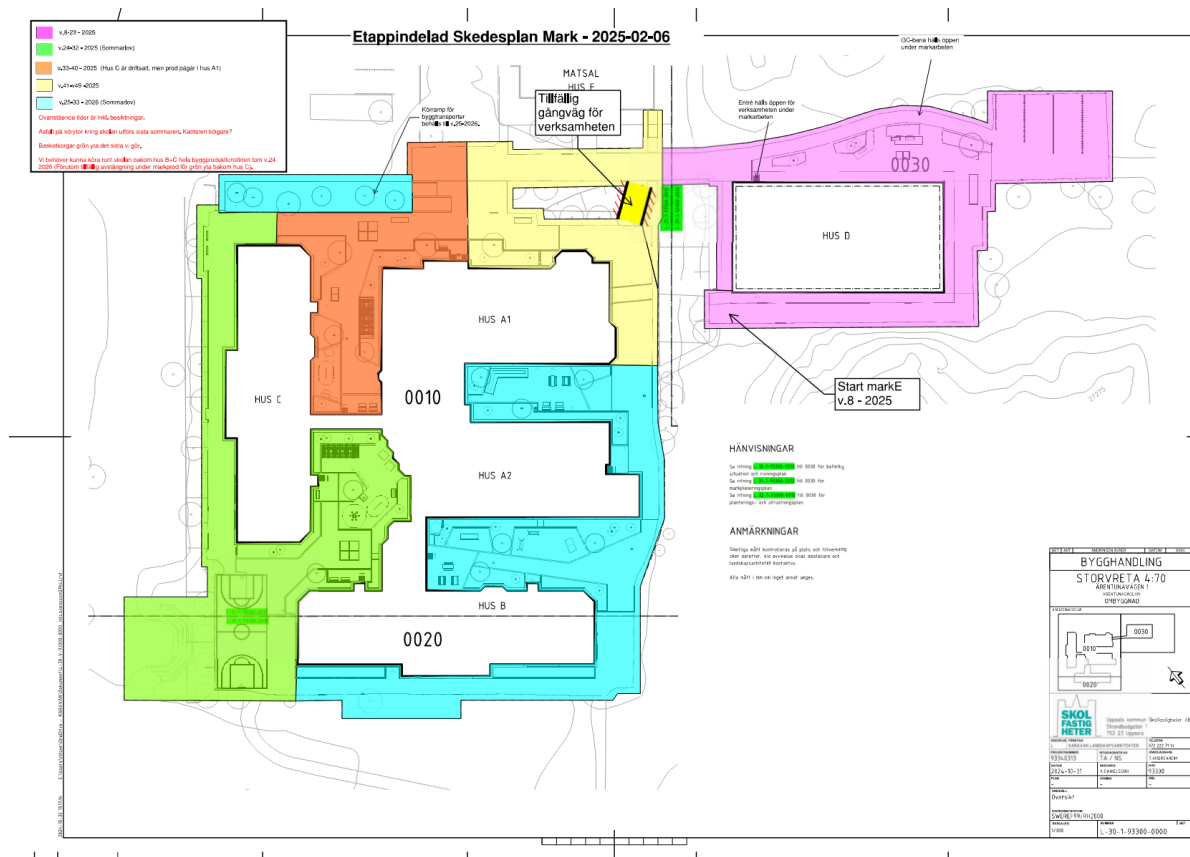

INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN





www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



Lägger grunden. Bygger framåt.

