

# INFORMATIONSBREV vecka 12 2025

## Renovering Ärentunaskolan

Hej hej!

Vilken härlig vecka, alla entreprenörer är på plats och jobbar på. Allt går enligt plan.

Vi är i full gång med byggnadsarbeten i Hus A1. Rivningen är nästintill färdigställd. Installationsarbeten har påbörjats och gipsarbeten i form av innerväggar pågår för fullt på plan 2.

I Hus C pågår matläggning i korridoren och elektrikern kompletterar armaturer i klassrummen. På taket pågår montage av solceller och sista takluckorna.

I dagsläget jobbar cirka 48 personer i projektet.

Nedan redovisas vad som kommer pågå de närmaste veckorna:

### Vecka 12

- Matläggning pågår i Hus C
- Start dörrmontage i Hus C
- Montage rumsbildande innerväggar pågår i Hus A1
- Installationsarbeten i Hus A1

### Vecka 13

- Montage invändiga partier i Hus C
- Montage sittgradäng i Hus C
- Start målning i Hus A1
- Relining av avloppsrör i Hus A1

### Vecka 14

- Montage socklar och lister i Hus C
- El- och ventilationskompletteringar i Hus C
- Kanalisation och kabeldragning i Hus A1
- Målning pågår i Hus A1


## Vecka 15

- Montage fast inredning i Hus C
- Start iplattning undertak i Hus C
- Installationsarbeten pågår i Hus A1
- Start plåtarbeten Hus A




Önskar er en fin eftermiddag!

*Med vänlig hälsning*  
**Projekt Ärentunaskolan**

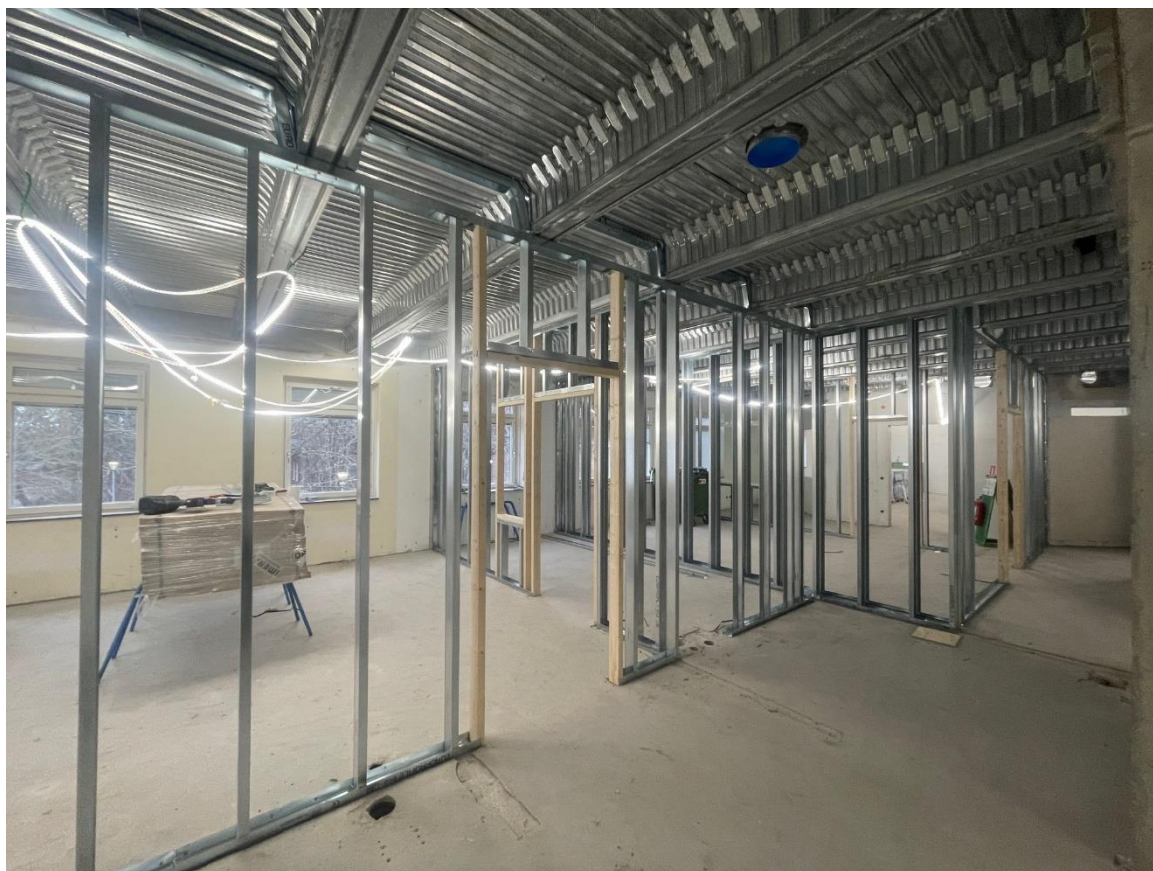

# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)  
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

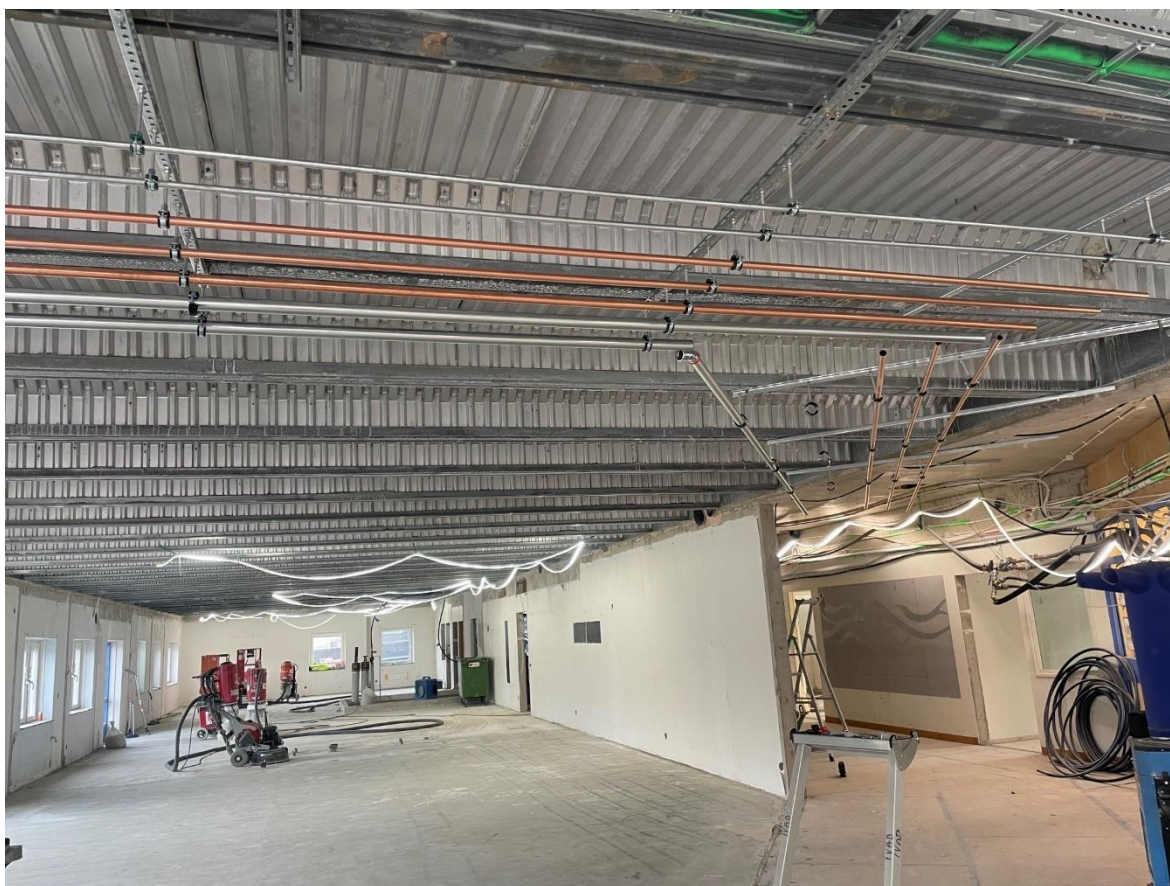


# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



Lägger grunden. Bygger framåt.

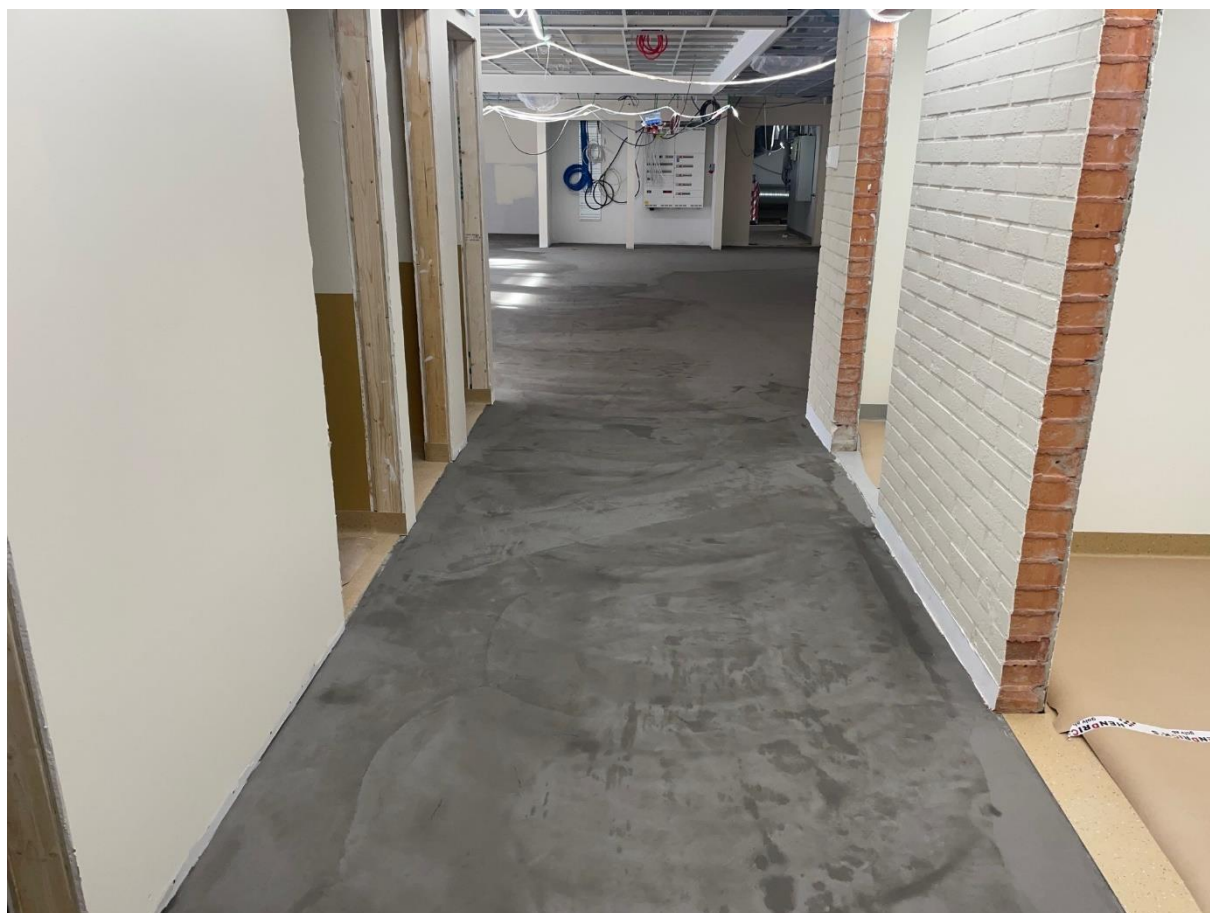

# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



Lägger grunden. Bygger framåt.

