

INFORMATIONSBREV vecka 43 2025

Renovering Ärentunaskolan

Hej hej!

Hoppas ni har haft en trevlig vecka.

I onsdags lämnade vi över huvudbyggnaden, Hus A1, till Skolfastigheter. Det har redan börjat förberedas med kompletterande fast inredning inför skolverksamhetens inflytt i lokalerna under nästa vecka.

I Hus A2, plan 2 pågår kompletteringar i undertaket samt montage av lister och foder. Nästa vecka planerar vi att lägga i undertaksplattor.

I Hus A2, plan 1 har mattläggaren påbörjat arbetet med att lägga mattor i NO-salarna. Elektrikern arbetar med kompletteringar i undertaket.

Markarbetena är färdigställda på ytorna mellan Hus A1 och Hus C samt vid den stora entrén. Asfalteringen kommer ske senare.

I dagsläget är vi cirka 35 personer ute på bygget.

Här är en översikt över vad som kommer att pågå de närmaste veckorna:

Vecka 44

- Start montage bänkskåp I NO-salar, Hus A2, plan 1
- Kompletteringar i undertak, Hus A2, plan 1
- Mattläggning, Hus A2, plan 1

Vecka 45

- Start plattsättning, Hus A2, plan 1
- Kompletteringar i undertak, Hus A2
- Montage dörrar, Hus A2, plan 1
- Strat rivning, Hus B

Vecka 46

- Montage invändiga partier, Hus A2
- Montage lister, smyg o foder, Hus A2
- Montage invändiga partier, Hus A2
- Plattsättning, Hus A2, plan 1

Vecka 47

- Kompletteringar undercentral, Hus A2
- Montage lister, smyg och foder, Hus A2
- Montage fast inredning, Hus A2
- El-, rör- och ventilations kompletteringar




Ha en fin helg!

Med vänlig hälsning

Projekt Ärentunaskolan



www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

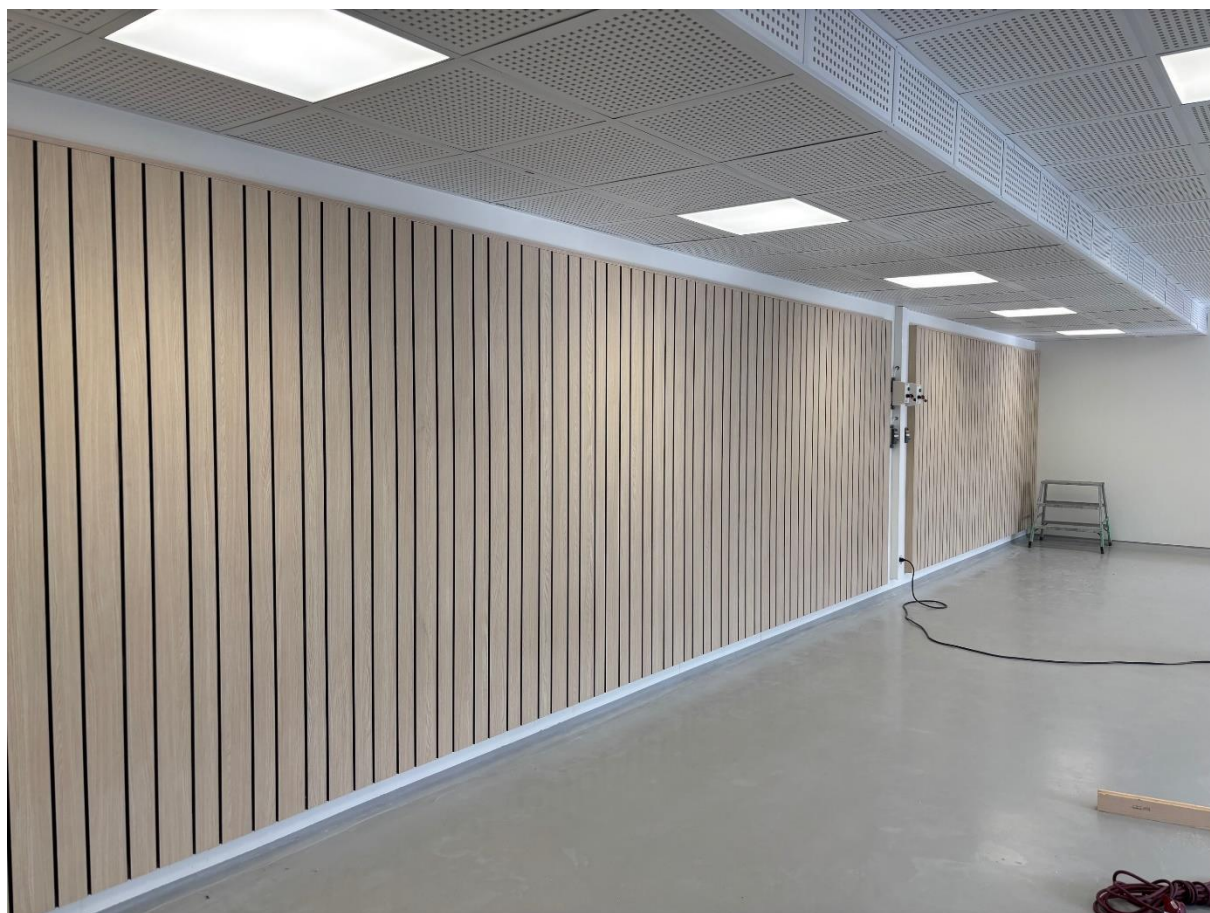

INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN




INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

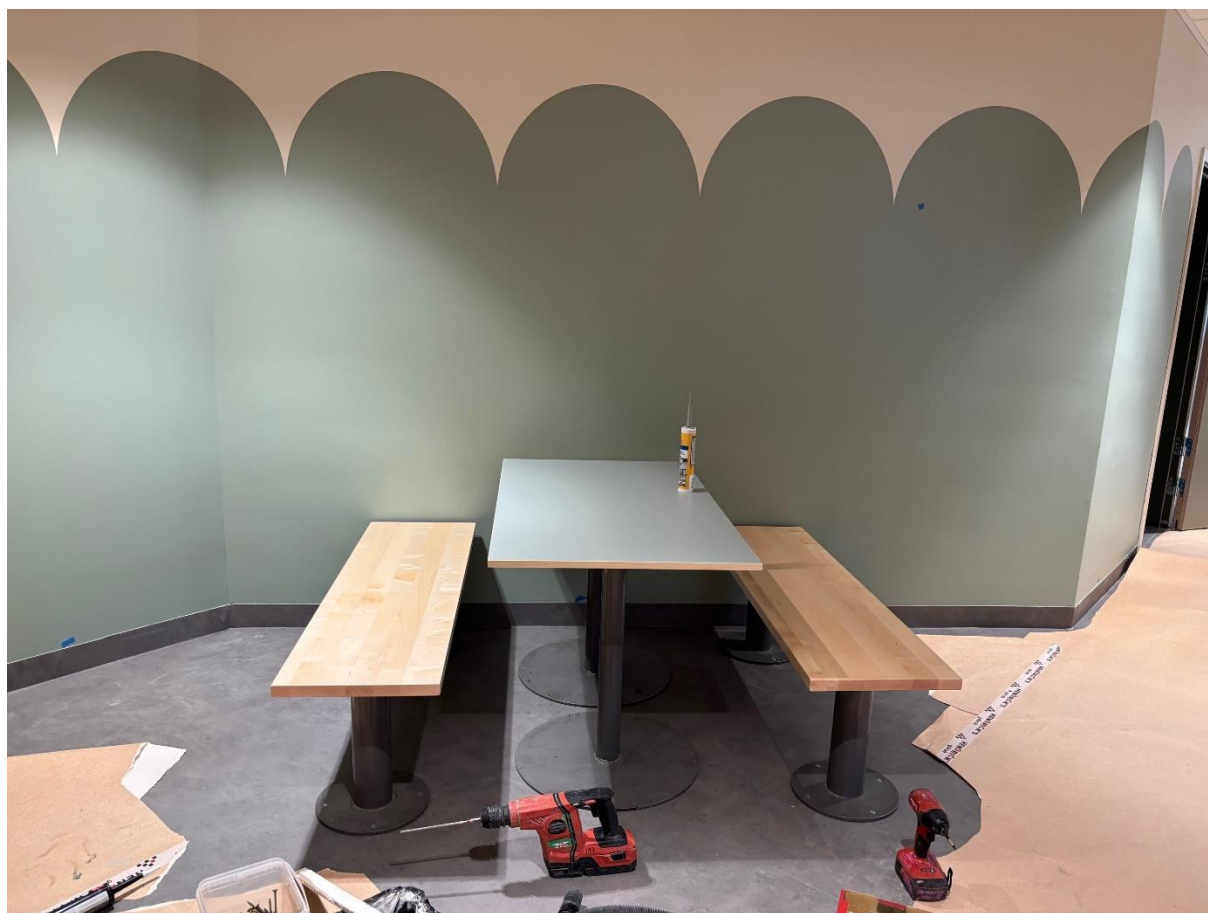

INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN





www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

