

INFORMATIONSBREV vecka 07 2026

Renovering Ärentunaskolan

Hej hej!

Nu är vi i full gång med våra byggnadsarbeten i Hus B.

Kompletteringar i undertak, inkoppling av ventilationsaggregat i fläktrum, montage av bärverk till undertaksplattor samt målningsarbeten pågår för fullt.

Mattläggning och dörrmontage kommer att påbörjas inom kort.

Markarbete återupptas när vädret tillåter det.

I dagsläge jobbar cirka 20 personer på arbetsplatsen.

Här är en översikt över vad som kommer att pågå de närmaste veckorna:

Vecka 08

- Montage radiatorer, Hus B
- Start kompletteringar i undertak, Hus B
- Montage undertak, Hus B
- Plåtarbeten, Hus B

Vecka 09

- Kompletteringar i undertak, Hus B
- Start mattläggning, Hus B
- Montage undertak, Hus B
- Takarbeten, Hus B

Vecka 10

- Koppla ventilationsaggregat fläktrum, Hus B
- Mattläggning, Hus B

- Fasadarbeten, Hus B
- Kompletteringar i undertak, Hus B

Vecka 11

- Start dörrmontage, Hus B
- Start plattsättning, Hus B
- Plåtarbeten, Hus B



Trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Projekt Ärentunaskolan

INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN




INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE


www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

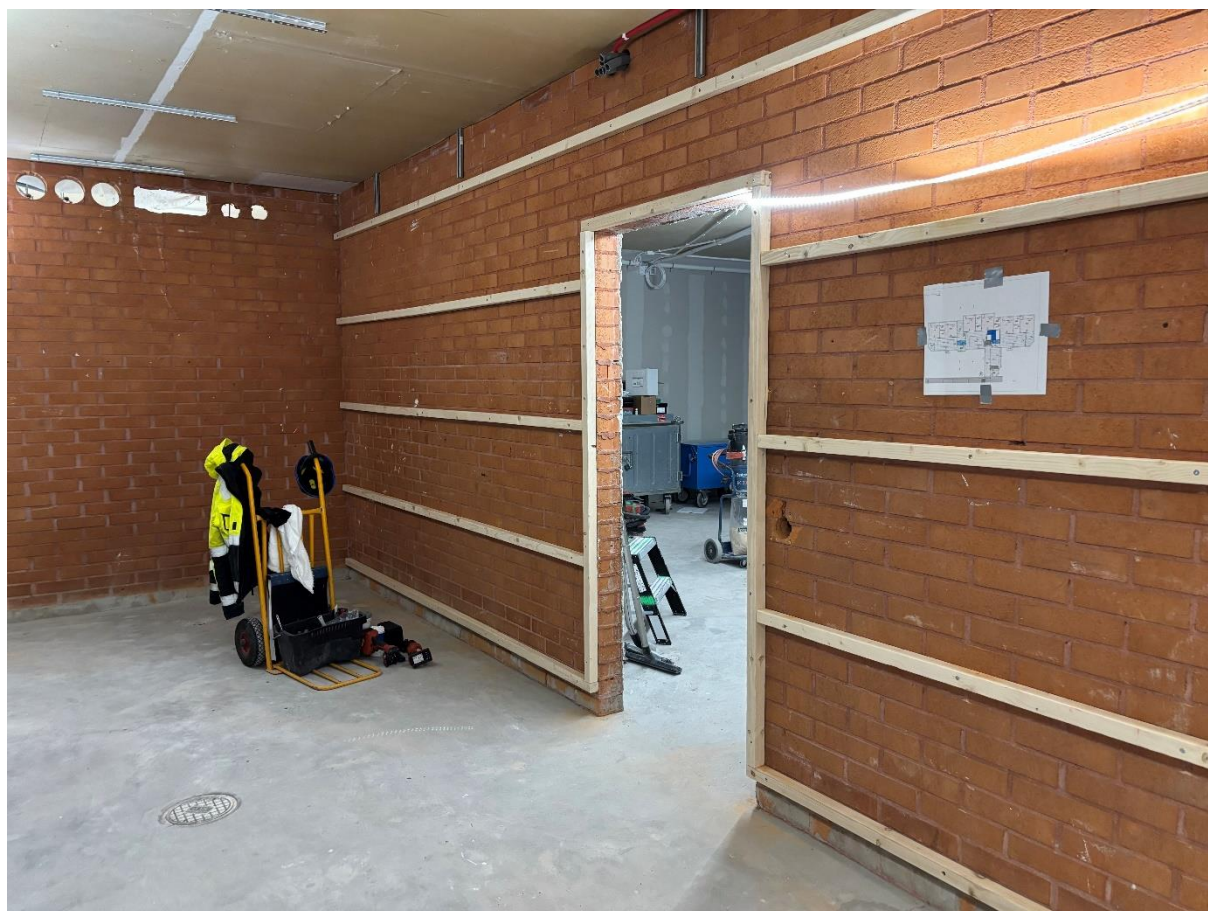

INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

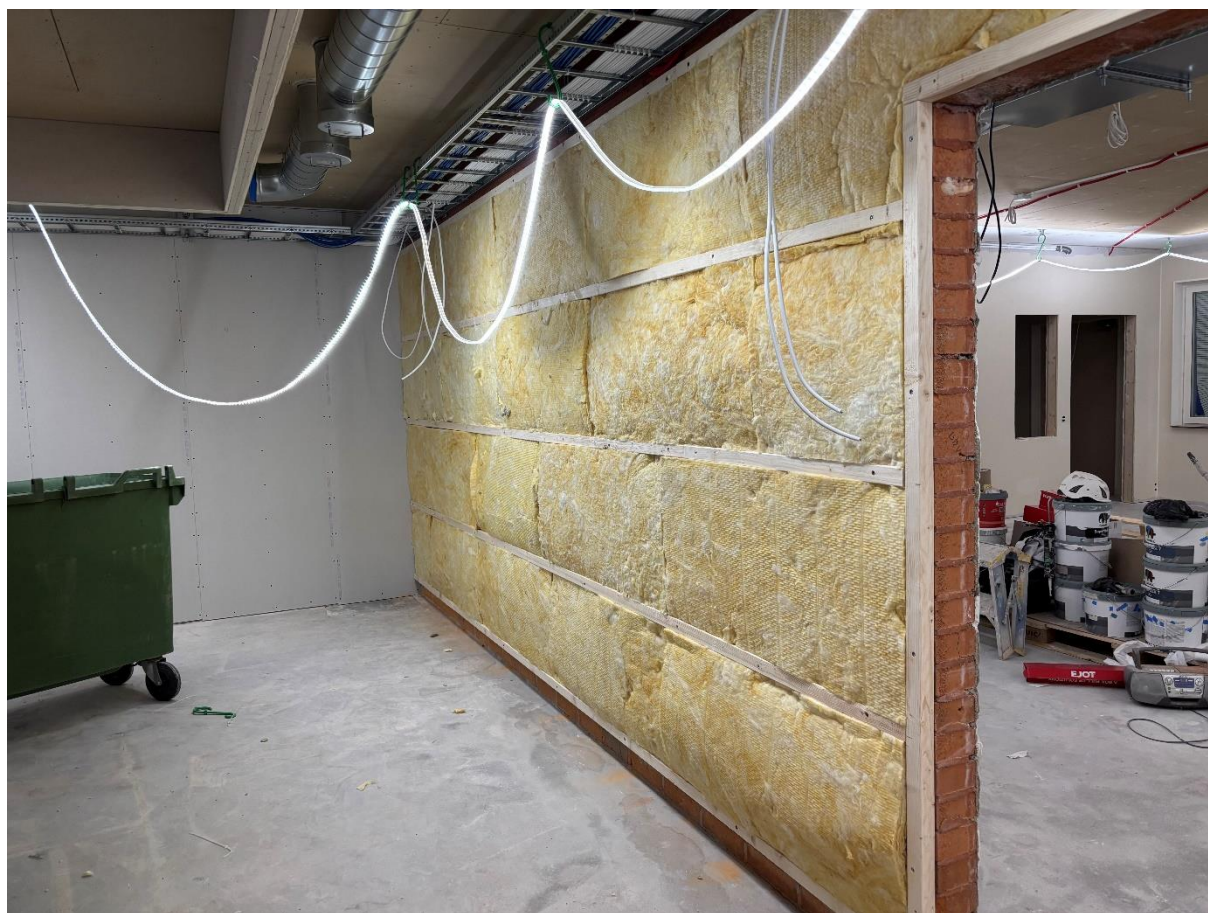

INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



Lägger grunden. Bygger framåt.



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

