

INFORMATIONSBREV vecka 04 2025

Renovering Ärentunaskolan

Hej hej!

Nu är vi i full gång med byggnadsarbeten i Hus C. Målningen och installationsarbeten pågår för fullt. Under nästa vecka startar undertaksarbeten samt arbeten med akustikpaneler i paus-/studieytan. I Hus A1 har vi börjat flytta hemkunskapssalen och att bygga provisoriska specialsalar i Hus A2.

I dagsläget jobbar ca 14 personer i Hus C och 4 personer i Hus A.

Nedan redovisas vad som kommer pågå de närmaste veckorna:

Vecka 05

- Leverans ventilationsaggregat
- Start undertak
- Isolering ventilationskanaler pågår

Vecka 06

- Start montage radiatorer
- Ventilationskanaler ovan undertak pågår
- El-kompletteringar i undertak

Vecka 07



- Montage fönsterbänkskanaler
- El-kompletteringsarbeten
- Montagearbeten i fläktrum

Vecka 08

- Start Hus A1
- Fönsterbänkskanaler i Hus C
- Vent kompletteringar i Hus C

Önskar er en trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Projekt Ärentunaskolan

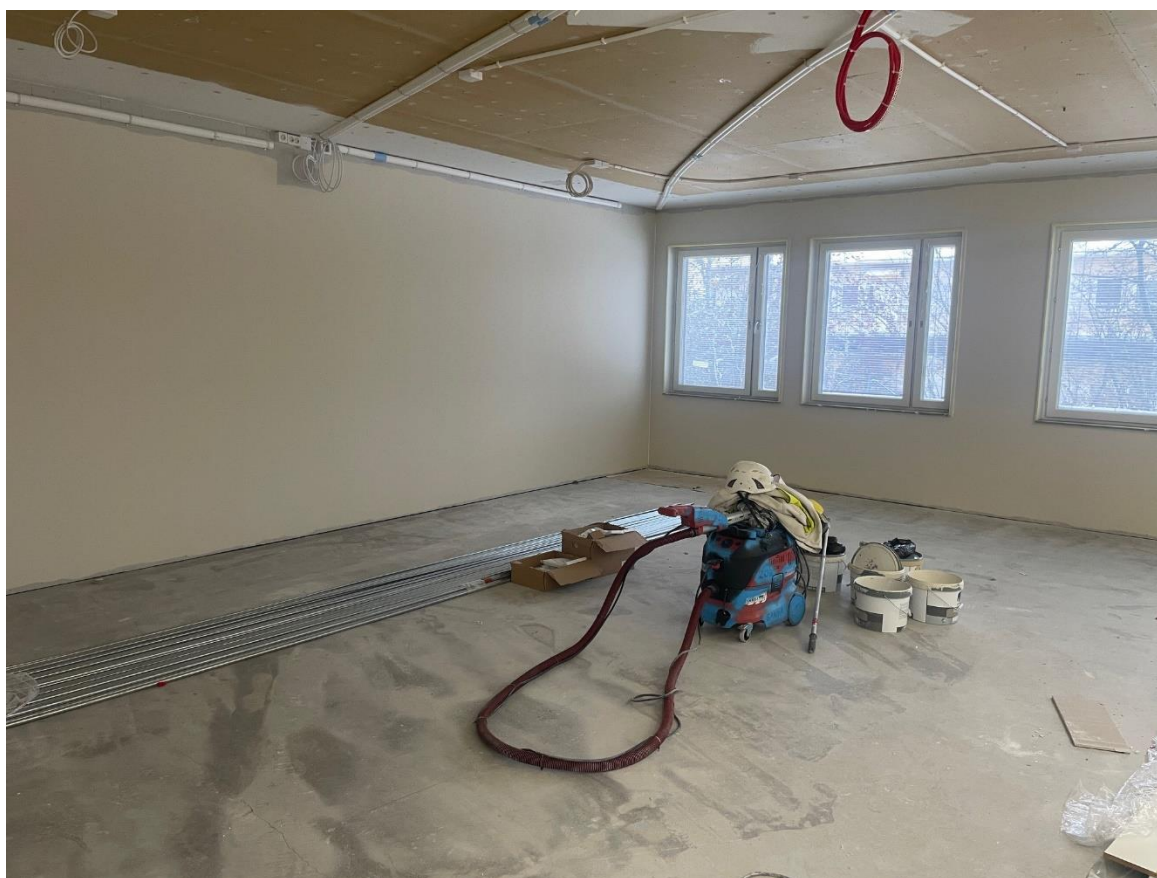

INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



Lägger grunden. Bygger framåt.



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

